

# ALLEGATO "A"

Comune di OSPEDALETTI

Provincia di IM

## DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE PARCO OUTDOOR E FITNESS LUNGO LA CICLOVIA TIRRENICA  
Opera finanziata con:

-Decreto del Dirigente del Settore programmi urbani complessi ed edilizia della  
regione Liguria, n. 3674 del 10.06.2022, per → 200\_000,00;

-Cofinanziamento Comune di Ospedaletti, per → 55\_000,00

**COMMITTENTE:** Comune di Ospedaletti.

**CANTIERE:** Area limitrofa pista ciclabile esistente, OSPEDALETTI (IM)

Ospedaletti , 28/04/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Cordeglio Luca)

*per presa visione*

IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Responsabile dell'Ufficio LL.PP. Arch. Salsi Massimo)

Ingegnere Cordeglio Luca

Via Aurelia n°110

18017 San Lorenzo al Mare (IM)

Tel.: 3496160057 - Fax: -

E-Mail: cordeglio@ingsl.it

REALIZZAZIONE PARCO OUTDOOR E FITNESS LUNGO LA CICLOVIA TIRRENICA


Opera finanziata con:

-Decreto del Dirigente del Settore programmi urbani complessi ed edilizia della regione Liguria, n. 3674 del 10.06.2022, per → 200\_000,00;

-Cofinanziamento Comune di Ospedaletti, per → 55\_000,00 - Pag. 1

Nome attività	Durata	Giu 23														Lug 23														Ago 23														Set 23														Ott 23																																																																																																																																																																																																																													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																							
<b>01 - ALLESTIMENTO CANTIERE</b>	53 g	▶																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	Z1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Montaggio del ponteggio metallico fisso	2 g																																																																																																																																											Z1	2																																																																																																																																										
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>02 - SCAVI E OPERE STRUTTURALI</b>	61 g	▶																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Scavo di sbancamento	9 g	Z1	9																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazio	25 g																																																																																																																																											Z1	25																																																																																																																																										
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	25 g																																																																																																																																											Z1	25																																																																																																																																										
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazio	15 g																																																																																																																																											Z1	15																																																																																																																																										
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	16 g																																																																																																																																											Z1	16																																																																																																																																										
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno	10 g																																																																																																																																											Z1	10																																																																																																																																										
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti	10 g																																																																																																																																											Z1	10																																																																																																																																										
<b>05 - OPERE ARCHITETTONICHE</b>	63 g	▶																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Formazione di massetto per pavimenti interni	7 g																																																																																																																																											Z1	7																																																																																																																																										
Realizzazione di tamponature	8 g																																																																																																																																											Z1	8																																																																																																																																										
Posa di pavimenti per interni in ceramica	5 g																																																																																																																																											Z1	5																																																																																																																																										
Posa di rivestimenti interni in ceramica	7 g																																																																																																																																											Z1	7																																																																																																																																										
Montaggio di serramenti interni	8 g																																																																																																																																											Z1	8																																																																																																																																										
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	5 g																																																																																																																																											Z1	5																																																																																																																																										
Montaggio di serramenti esterni	8 g																																																																																																																																											Z1	8																																																																																																																																										
<b>04 - IMPIANTI</b>	19 g	▶																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanit	19 g																																																																																																																																											Z1	19																																																																																																																																										
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impiant	19 g																																																																																																																																											Z1	19																																																																																																																																										
Realizzazione di impianto elettrico	19 g																																																																																																																																											Z1	19																																																																																																																																										
<b>06 - DISALLESTIMENTO CANTIERE</b>	5 g	▶																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Smobilizzo del cantiere	5 g																																																																																																																																											Z1	5																																																																																																																																										
<b>LEGENDA Zona:</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Z1 = ZONA UNICA																																																																																																																																																																																																																																																																																					

06 Nov 23 13 Nov 23 20 Nov 23 27 Nov 23 04 Dic 23 11 Dic 23 18 Dic 23 25 Dic 23 01 Gen 24 08 Gen 24 15 Gen 24 22 Gen 24 29 Gen 24 05 Feb 24 12 Feb 24 19 Feb 24 26 Feb 24 04 Mar 24 11 Mar 24

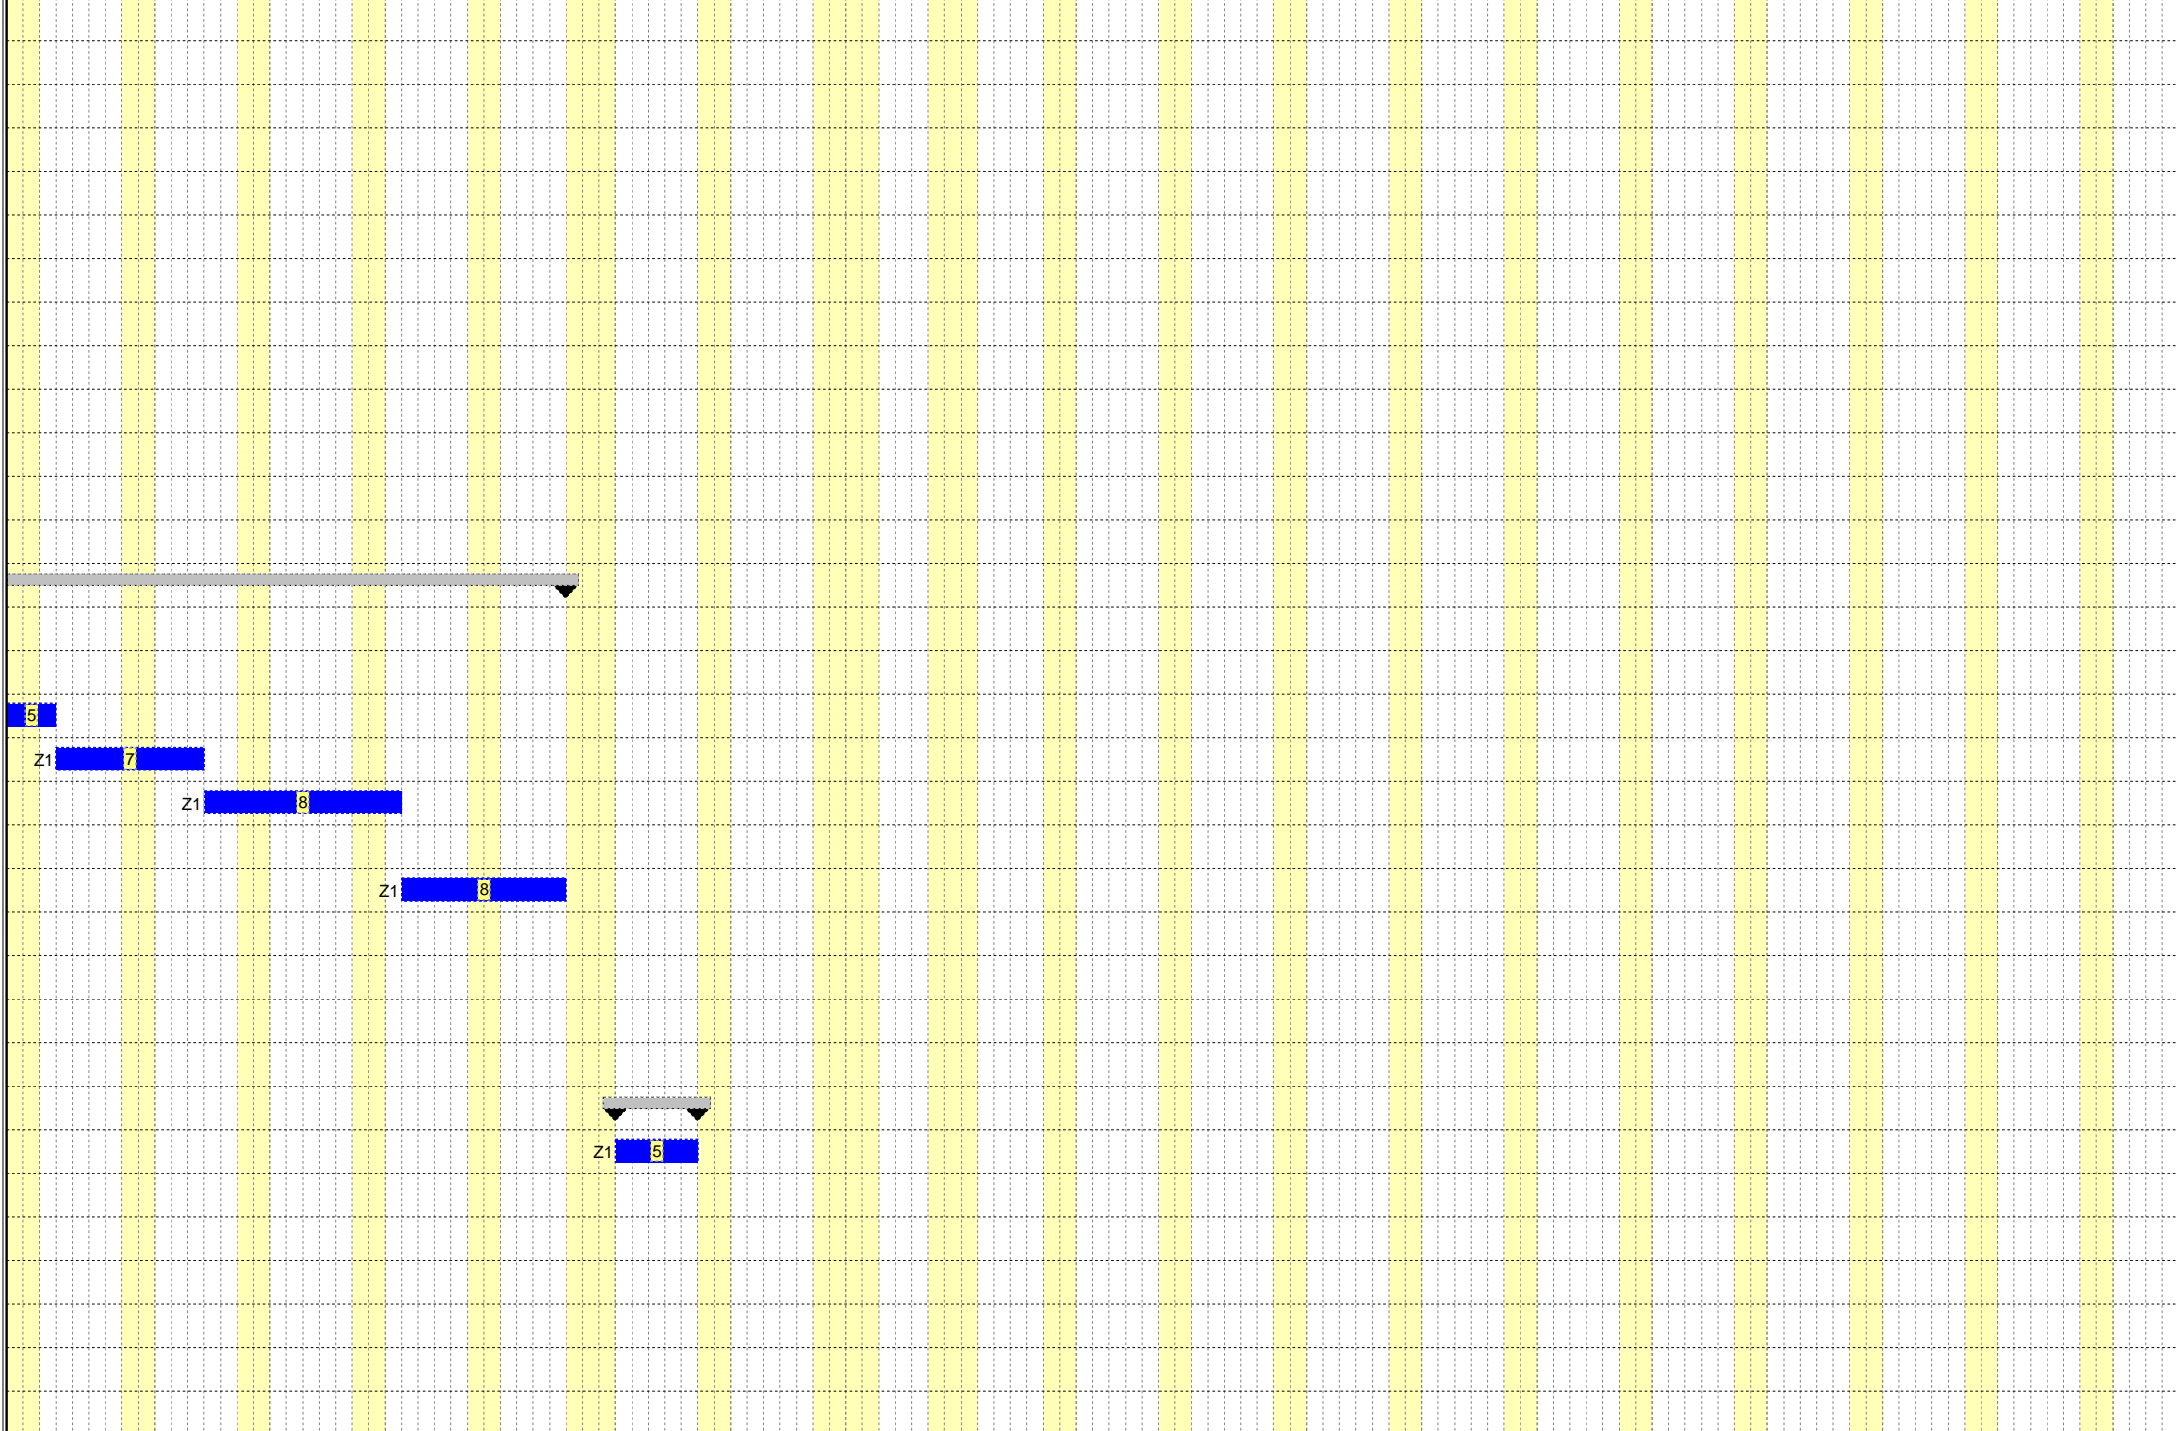


5

Z1 7

Z1 8

Z1 8



Z1 5
